


D. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

D.1. Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo.



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	October 2020							November 2020															
					28	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
1	ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL	50 days	Mon 5/10/20	Mon 23/11/20																							
2	INICIO	0 days	Mon 5/10/20	Mon 5/10/20																							
3	PRELIMINARES	20 days	Mon 5/10/20	Sat 24/10/20																							
4	Desmante de puertas completas sencillas	6 days	Mon 5/10/20	Sat 10/10/20																							
5	Desmante de puertas completas doble	6 days	Mon 5/10/20	Sat 10/10/20																							
6	Desmante de Lámparas existentes	6 days	Mon 5/10/20	Sat 10/10/20																							
7	Desmante de estrado y plataforma existentes	6 days	Mon 5/10/20	Sat 10/10/20																							
8	Desmante de aparatos sanitarios existente	6 days	Mon 5/10/20	Sat 10/10/20																							
9	Mantenimientos en puertas sencillas existentes	6 days	Mon 5/10/20	Sat 10/10/20																							
10	Demolición de muros de sheetrock	6 days	Mon 5/10/20	Sat 10/10/20																							
11	Demolición de muros de bloques	6 days	Mon 5/10/20	Sat 10/10/20																							
12	Retiro de cerámica de pared	6 days	Mon 5/10/20	Sat 10/10/20																							
13	Demolición de pisos existentes en área de baño	6 days	Mon 5/10/20	Sat 10/10/20																							
14	Retiro de zócalos existentes	6 days	Mon 5/10/20	Sat 10/10/20																							
15	Traslado de material a lugar de acopio	6 days	Sun 11/10/20	Fri 16/10/20																							
16	Bote de material acopiado	8 days	Sat 17/10/20	Sat 24/10/20																							
17	MUROS	8 days	Sun 25/10/20	Sun 1/11/20																							
18	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	8 days	Sun 25/10/20	Sun 1/11/20																							
19	Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, (Incluye estructura calibre 22)	8 days	Sun 25/10/20	Sun 1/11/20																							
20	TERMINACIÓN DE TECHOS	10 days	Sun 25/10/20	Tue 3/11/20																							
21	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	10 days	Sun 25/10/20	Tue 3/11/20																							
22	Suministro e Instalación de fascia en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	10 days	Sun 25/10/20	Tue 3/11/20																							
23	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	8 days	Wed 4/11/20	Wed 11/11/20																							
24	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	8 days	Wed 4/11/20	Wed 11/11/20																							
25	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	8 days	Wed 4/11/20	Wed 11/11/20																							
26	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	8 days	Wed 4/11/20	Wed 11/11/20																							
27	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	8 days	Wed 4/11/20	Wed 11/11/20																							
28	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	8 days	Wed 4/11/20	Wed 11/11/20																							
29	INSTALACIONES ELECTRICAS	12 days	Wed 4/11/20	Sun 15/11/20																							
30	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	12 days	Wed 4/11/20	Sun 15/11/20																							
31	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey 4" (Luz blanca) con dimmer de 9 watts	12 days	Wed 4/11/20	Sun 15/11/20																							
32	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	12 days	Wed 4/11/20	Sun 15/11/20																							
33	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	12 days	Wed 4/11/20	Sun 15/11/20																							
34	Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	12 days	Wed 4/11/20	Sun 15/11/20																							
35	Suministro e Instalación Salida de Data	12 days	Wed 4/11/20	Sun 15/11/20																							
36	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 1", registros de 6" x 6" x 6, abrazaderas emt 1", conectores rectos de 1" coplin de 1")	12 days	Wed 4/11/20	Sun 15/11/20																							
37	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	12 days	Wed 4/11/20	Sun 15/11/20																							
38	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	12 days	Wed 4/11/20	Sun 15/11/20																							

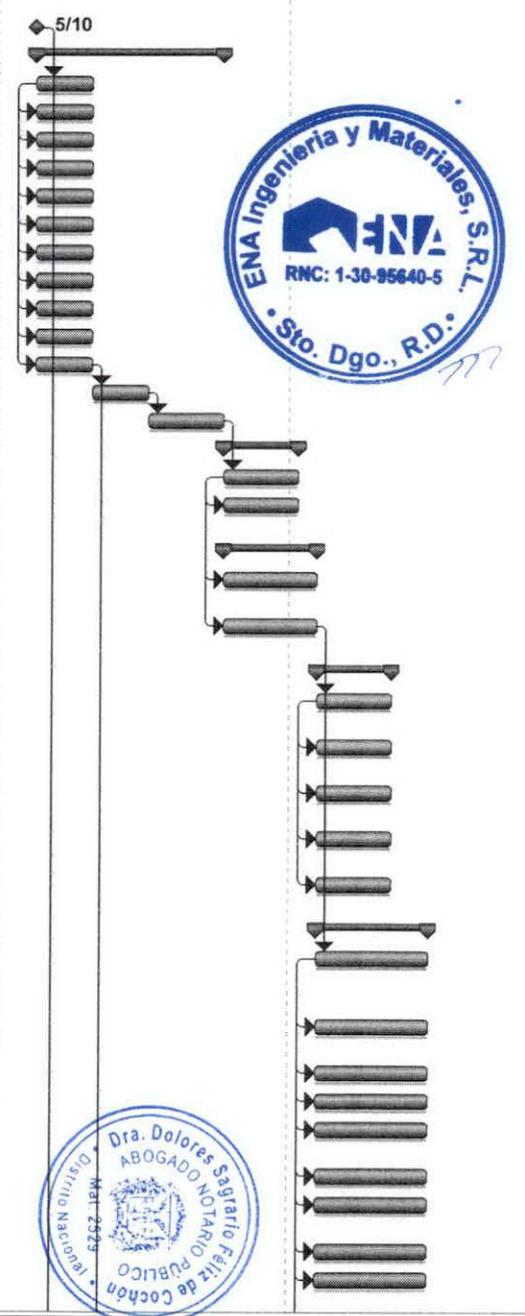



D.2. Garantía de los bienes y/o servicios cotizados.
(si aplica)



D8



Ingeniería & Materiales, S.R.L.

Distrito Nacional, Sto. Dgo.
20 de agosto de 2020

Señores de
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA


Referencia: **ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL. (CP-CPJ-004-2020)**

Muy cordialmente:

Nosotros, la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S.R.L.** con **RNC: 130-956-405** y domiciliados en la **C/ Luis Padilla # 15 Los Prados, Distrito Nacional, Santo Domingo**; en lo referente **ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL. (CP-CPJ-004-2020)**, nos comprometemos a entregar a cabalidad y en las mejores condiciones de calidad cumpliendo con las especificaciones suministradas en dicho proceso y con las normativas y leyes vigentes en la Republica Dominicana. Dichos trabajos tendrán una **garantía de 1 año a partir de su entrega formal**.

En caso de presentarse algún contratiempo de fuerza mayor o externa a nuestro alcance o de su Institución que modificará de manera desfavorable las condiciones ya establecidas, y que por consiguiente mermará o limitará la continuidad de las actividades. Por lo cual deberá de otorgarse una prórroga de tiempo, bajo el pleno acuerdo entre las partes, la cual corresponderá al recalcular de los tiempos estimado de todas aquellas actividades que fuesen afectadas directa o indirectamente.

Muy atentamente,


Ing. Miguel Suarez
Gerente



TEL. 809-227-2309 | INFO@ENA-INGENIERIA.COM
C/ LUIS PADILLA #15, LOS PRADOS, D.N., STO. DGO.
RNC:130-956-405



D.3. Demostrar mínimo de cinco (5) años de experiencia de la empresa, demostrable con certificación conforme de recepción de obra. Tres (03) Cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de obras de similares.





EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: **ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.**

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos [6] años.

Título del proyecto/ Tipo de Obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de Obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No -No
A) Nacionales							
Remodelación y asfaltado de nuevas oficinas de Engimat	RD\$ 6,789,556.00	4 Meses	Octubre 2014	100%	Propietario de Engimat	P	Sí
Construcción de Edificación para Oficina y Almacén; Verja Perimetral para la Ferretería VIATEC. (Incluye Área Verde)	RD\$13,423,459.00	3 meses	Marzo 2015	100%	Constructora VIATEC	S	Sí
Caseta en Hierro de 10 x 10 m, Techado en Aluzinc	RD\$ 55,700.00	1 Mes	2015	100%	IIBI	P	Sí
Trabajos en edificio comercial BA Santiago: -Construcción de Cisterna. -Construcción de cerramientos del proyecto. -Construcción de cuarto de máquinas.	RD\$2,745,358.00	3 Meses	03 marzo 2016	100%	Ingeniería Luciano Rosario, Edificio Comercial BA Santiago de los Caballeros	S	Sí
Construcción en Estancia infantil Esperanza, Provincia Valverde de: -Cerramiento Verja perimetral -Cisterna 8,000 galones -Comedor según diseño	RD\$3,581,527.60	3 Meses	28 agosto 2016	100%	Ing. José Cabrera	S	Sí
Limpieza de cañadas, construcción de drenaje pluvial y obras complementarias en la zona de Haina. (Alcance de la Obra: Excavación y bote de 3265.45 m3)	RD\$ 3,487,965.00	5 Meses	Febrero 2017	100%	Constructora VILTHE	S	Si
Demolición de estructuras civiles, desmonte, corte de material inservible y colocación de terracerías para fines de la construcción de Apartamentos en la zona de San José de los Llanos, San Pedro de Macorís. (Alcance de la Obra: Demolición y Bote de escombros equivalentes a 12,489.17 m2.)	RD\$ 8,742,419.56	3 Meses	Octubre 2018	100%	Constructora VILTHE	S	Si
Construcción del centro empresarial Villa Olga.	RD\$8,548,964.56	6 meses	Enero 2019	100%	Grupo Carrasco Adames	S	Si

/UR.02.2014




DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



Construcción Aceras y Contenes Los Mangos.	RD\$ 3,588,539.85	3 Meses	Marzo 2019	100%	Ayuntamiento del Municipio del Santiago	P	Aun No
Rehabilitación Planta Potabilizadora y Ampliación red de Distribución del Acueducto de las Matas de Farfán, Provincia San Juan.	RD\$10,476,746.40	3 Meses	Marzo 2019	75%	INAPA	P	Aun No
Construcción del edificio de oficinas administrativas del centro de distribución de la cervecera nacional Dominicana. . (Alcance de la Obra; Construcción de una Edificación; Preparación, suministro colocación de hormigón industrial, para calles, aceras y contenes).	RD\$ 21,498,375.86	6 meses	Mayo 2019	100%	(Constructora Suarez García EIRL)	S	Si
Construcción de verja de cerramiento en todo el perímetro del proyecto centro de distribución de Samaná.	RD\$ 13,524,727.15	2 meses	Junio 2019	100%	Constructora Suarez García	S	si
Construcción Alcaldía del Distrito Municipal Jorgillo, Provincia San Juan, Republica Dominicana. (Alcance de la Obra; Construcción de una Edificación, una verja en block, área verde con colocación de grama y plantas ornamentales y un área de parqueo asfaltado).	RD\$ 5,061,299.56	2 Meses	Agosto 2019	80%	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)	P	Aun No
Construcción de Aceras, imbornal y colector Principal Pluvial en las plantas de Microtek.	RD\$ 2,476,591.45	3 meses	Agosto 2019	100%	Microtek Dominicana,S.A	P	Si
Remozamiento de la unidad de San Cristóbal de Instituto Dermatológico y Cirugía de la piel. (Alcance de la Obra; Divisiones Ligueras en Sheetrock, Cambio de Puertas y Ventanas, Impermeabilización de Techos, Colocación y Brillado de Pisos, Instalaciones Eléctricas y Luminarias, Instalaciones Hidrosanitarias, Pintura General y Construcción de Muro Perimetral)	RD\$13,546,893.30	2 Meses	Agosto 2019	100%	Patronato de Lucha Contra La Lepra, INC.	P	Si
Rehabilitación de Pintura en distintas dependencias de INESPRES	RD\$ 3,298,335.36	2 meses	Septiembre 2019	100%	INESPRE	P	Si
Reparaciones áreas del 7mo Piso Edificio SCJ (Alcance de la Obra; Mantenimiento de Puertas, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de Luminarias, Instalación de Plafón, Instalaciones Hidrosanitarias, Pintura en General, Pulido y Brillado de pisos, mesetas y paredes)	RD\$ 1,664,767.21	1 mes	Septiembre 2019	100%	Consejo del Poder Judicial	P	Si
Remozamiento del Parque Las Praderas y Construcción de Aceras y Contenes en la calle Respaldo San Juan km 8 ½ sector San Miguel, Distrito Nacional.	RD\$ 4,347,750.42	3 meses	Diciembre 2019	100%	Ayuntamiento del Distrito Nacional	P	No

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en ___ folios adjuntos.


Ing. Miguel Suarez



Dra. Dolores Sabatino Feijó
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Distrito Nacional
Cochón
May 2020



ENA Ingeniería y Materiales, S.R.L.
RNC: 1-30-95640-5
Sto. Dgo., R.D.



26 de noviembre de 2019
Santo Domingo, Rep.Dom.

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **ENA Ingeniería y Materiales, S.R.L.**, con el número de **RNC: 1-30-95640-5**, fue subcontratada para ejecutar los trabajos de la **Construcción del Edificio de Oficinas Administrativas del Centro de Distribución de la Cervecería Nacional Dominicana ubicado en la zona de Sánchez, Samaná**. Este trabajo fue realizado de manera satisfactoria desde Mayo a Noviembre del año 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de **RDS 21,498,375.86**.



Atentamente,



Jabib Suárez

Ing. Jabib Suárez
Gerente General



20 de noviembre de 2019
Santo Domingo, Rep.Dom.


CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **ENA Ingeniería y Materiales, S.R.L.**, con el número de **RNC: 1-30-95640-5**, fue subcontratada para ejecutar los trabajos del **Proyecto de Centro de Distribución de Samaná de la Cervecería Nacional Dominicana**. Este trabajo consistió en la **Construcción de verja de cerramiento en todo el perímetro del proyecto** fue realizado de manera satisfactoria en el periodo entre Junio – Septiembre del año 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de **RDS 13,524,727.15**.



Atentamente,




Ingeniero Jabib Suárez
Gerente General





Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones




A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, hacemos constar, que la empresa ENA INGENIERÍA Y MATERIALES, S.R.L., RNC 130956405 forma parte de nuestro catálogo de suplidores, en el rubro de servicios de mantenimiento y reparación de construcciones e instalaciones.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, República Dominicana, a los ocho (08) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, (2019).

Atentamente,


Paola L. Cuevas
Gerente





Patronato de Lucha Contra la Lepra, Inc.
Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel
"Dr. Huberto Bogaert Díaz"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
08 de octubre de 2019



CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **ENA Ingeniería y Materiales, S.R.L.**, con el número de **RNC: 1-30-95640-5**, fue contratada para ejecutar los trabajos de **Remozamiento de la unidad de San Cristóbal del Instituto Dermatológico y cirugía de la piel**. Este trabajo consistente en divisiones ligeras en sheetrock, cambio de puertas y ventanas, impermeabilización de techos, colocación y brillo de pisos, instalaciones eléctricas y luminarias, instalaciones hidrosanitarias, pintura general y construcción de muro perimetral fue recibido de acuerdo a los requerimientos exigidos en el mes de Agosto del 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de **RDS 13,546,893.30**.

Agradeciéndole anticipadamente su gentil atención.

Ing. J. Vicente Ruiz
Director Administrativo y Financiero
Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel
Dr. Huberto Bogaert Díaz



JVR/jhi.





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495"

"2019 Año del Desarrollo, las Inversiones y el Empleo"



OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
25 de Julio del 2019

A: Lic. Abel Martínez Durán.
Alcalde Municipal.

Vía: Licda. Hilda Ovalles.
Directora Administrativa.



Asunto: Certificación Recepción del de la obra, **CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, LOS MANGOS.**

Muy cortésmente, le hacemos la entrega formal del certificado correspondiente a la recepción de la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, LOS MANGOS**, del contrato No. AMS-2019-03 a favor de ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S.R.L., RNC: 1-3095640-5. D8

El monto total, más las partidas no contempladas en el presupuesto contratado pero que no exceden el monto del mismo, de los trabajos ejecutados de la obra mencionada suman **RD\$ 3,588,539.85 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRENTA Y NUEVE PESOS CON 85/100).**

En la inspección realizada comprobamos que la obra se ejecutó con los lineamientos pautados por el departamento, la buena calidad en los materiales, y el buen comportamiento y funcionamiento de los componentes de la misma.

Atentamente,



Ing. Leonela Espinal

Directora de Obras Públicas Municipal.



Keyla Paulino

Ing. Keyla Paulino

Miembro de La Comisión de Recepción.

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

RNC 4-01-01829-2

CERTIFICACIÓN



Por medio de la presente hacemos constar que la empresa ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S.R.L., con el número de RNC 1-30-95640-5, le fue adjudicada la licitación **INESPRE-CCC-CP-2019-0009** para la rehabilitación de pintura en distintas dependencias de la institución, por un monto de **Tres Millones Doscientos Noventa Y Ocho Mil Treientos Treinta Y Cinco Con 36/100 (RD\$ 3,298,335.36)**

Certificamos de igual manera que el proyecto fue recibido satisfactoriamente y pagado en su totalidad.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada en el Distrito Nacional, al primer (1) día del mes de mayo del año Dos Mil Veinte (2020).


Lic. Juan Céspedes
Enc. Administrativo




28 noviembre 2019
Santiago de los Caballeros, R.D.

CERTIFICACIÓN

Certificamos que la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.**, con **RNC: 130- 95640-5**, fue contratada para ejecutar trabajos de la construcción del Centro Empresarial Villa Olga. Este trabajo fue realizado de manera satisfactoria en Julio 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de **RDS 8,548,964.56**.


Atentamente,





José Roberto Carrasco
Presidente Grupo Carrasco Adames, SRL





ENGIMAT
(ENGINEERING MATERIALS)

1-31-06258-1



18 DE JULIO del 2015
SANTO DOMINGO, D.N.

A QUIEN PUEDA INTERESAR




NOSOTROS, LA EMPRESA Engimat, CERTIFICAMOS, QUE LA COMPAÑÍA ENA INGENIERIA Y MATERIALES, CON RNC: 130-95640-5, REALIZO TRABAJOS SATISFACTORIO EN LA CONTRUCCION DE OBRAS REMDELACIÓN DE NUEVA OFICINAS PRINCIPAL, ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DEL ESTACIONAMIENTO EN SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA, EN FECHA DESDE OCTUBRE 2014 HASTA FEBRERO 2015, LOS CUALES RECIBIMOS, ACEPTAMOS Y PAGAMOS A ENTERA SATISFACION, POR VALOR DE SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA SEIS PESOS CON 00/000. (RD\$6,789,556.00).

DS

ATENTAMENTE


Jandall Lladó Guerra
Presidente


ENGIMAT
(ENGINEERING MATERIALS)
RNC: 131062581



VIATEC

RNC 130-554-226

Carretera Palenque No. 187, Sainagua, San Cristóbal, República Dominicana

Ofic.809-528-3013, Cel. 809-720-8619

Email: viatec.constructora@gmail.com

13 De Septiembre De 2015
San Cristóbal, Rep. Dom.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Nosotros, la empresa **VIATEC**, certificamos que la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.**, con RNC No.: **130-956-405**, realizó trabajos satisfactorios de **Construcción de Edificación para Oficina y Almacén; y Verja Perimetral para la Ferretería VIATEC** en fecha de **marzo de 2015**.

Dichos trabajos fueron recibidos aceptamos y pagamos a entera satisfacción, por valor de **RD\$ 13,423,459.00**.

Atentamente,



Carlos Cofele
Director



14 de Junio del 2017
SANTO DOMINGO, D.N.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, INGENIERIA LUCIANO ROSARIO S.R.L., Certificamos que la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.**, con RNC: 130-95640-5, fue contratada para ejecutar trabajos de:

- Cisterna según especificaciones
- Cerramiento del proyecto
- Cuarto de Máquinas

Estos trabajos fueron ejecutados en el edificio comercial BA ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros en el que INGENIERIA LUCIANO ROSARIO sirvió como contratista general para el cliente BA Inmobiliaria. Los trabajos fueron recibidos a entera satisfacción y pagados en total por un valor de **RD\$ 2,745,358.00**.




Muy atentamente,




Ing. Marcos José Rosario de la Cruz
Gerente General





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, R.D.

07 de agosto 2020.

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Nombre del proyecto: **Construcción de Alcaldía del Distrito Municipal Jorgillo, Prov. San Juan de la Maguana.**

Contrato No. 261/2019.

Responsable: **ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S.R.L., representada por Ing. Manuel Humberto Michel Liriano.**

Fecha de finalización: **agosto 2020.**

Descripción de los trabajos entregados:

Partidas Generales, Movimiento d Tierra, Hormigón Armado, Muros de Bloques, Terminación de Superficie, Terminación de Techo, Terminación de Piso, Instalaciones Sanitarias, Terminación de Cocina, Instalaciones Eléctricas, Puertas y Ventanas, Terminación de Pintura, Varios, Verja en Block (Trabajos Preliminares, Movimiento de Tierra, Hormigón Armado, Muros de Bloques, Terminación de Superficie, Pintura, Puertas), Área de Parqueo (Movimiento de Tierra, Capa de Rodadura), Rehabilitación de Parque.



Ing. Diego Lassis Abreu

Director de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.

Líder en Energía Limpia




0019475

30 MAY 2016

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **ENA INGENIERIA Y MATERIALES, SRL.** RNC: **130956405**, realizo un trabajo satisfactorio en la construcción de una caseta de 100 metros cuadrados techada en tijerillas metálicas con aluzinc sobre columnas de tubos metálicos realizada del año 2015.

Atentamente



Licda. Gloria A. Santos
Enc. Administrativa y F.




D.4. Personal propuesto con dos (2) años de experiencia con título y preferiblemente una maestría. (Carnet del Codia, Certificación de Codia al día, Título Universitario).





**COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CODIA)**



APELLIDOS: Batista Santos **NOMBRES:** Yeimy del Carmen

PROFESION:
Arquitecta

EXEQUATUR 4

D/F: 13/01/2016

CÉDULA: 001-1808364-1

COLEGIATURA: 33631

YB

Firma colegiado

[Signature]

Firma Presidente





Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América

Fundada el 29 de octubre de 1538

El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por cuanto

Yenny Del Carmen Batista Santos


ha cursado en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Arquitectura de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobada en los exámenes correspondientes.

Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el título de

Arquitecta

Y para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, hoy día 24 de abril de 2013

Dr. José Joaquín Rojas Arevalo
Decano de la Facultad



Dr. Pablo Apiano Escobell
Rector

Dr. Yenny Del Carmen Batista Santos
Inscripción Facultad de la Universidad

Registramos copia al # 211162
Folio 5713 del libro de grados y títulos





CODIA Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com - www.codia.org.do

Tel: 829-378-0038

RNC: 401-00941-2

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
YEIMI DEL CARMEN BATISTA SANTOS ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 00118083641 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 33631, Exequatur No. 4 , de fecha 13/01/2016
de profesión **ARQUITECTO** .



Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 19 días del mes de Agosto del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Presidente CODIA

