

ORIGINAL



ING. AGRIM OSVALDO VALERA



osvaldovalera4@gmail.com | 809-694-7344

COMITÉ COMPRAS Y CONTRATACIONES
Consejo del Poder Judicial
Poder Judicial | Republica Dominicana
PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA (SOBRE A)
REFERENCIA: CP-CPJ-04-2024

Ing. Agrim. Osvaldo Valera

C/ San Pedro No. 9, Villa Velásquez, San Pedro de Macorís, RD.

809-694-7344 | osvaldovalera4@gmail.com

RNC: 402-2224078-6 | RM: 571SPM-PF



San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

Jueves 06, junio 2024



Sustitución de cúpulas del palacio de justicia de Puerto Plata

CREDENCIALES





PRESENTACIÓN DE OFERTA

06 de junio de 2024

Página 1 de 1

Señores
CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a. Hemos examinado y no tenemos reservas a la ficha técnica para el proceso de comparación de precios, para las **Sustitución de cúpulas del palacio de justicia de Puerto Plata CP-CPJ-04-2024**, incluyendo las adendas realizadas a los mismos.
- b. De conformidad con la ficha técnica y el cronograma de ejecución, nos comprometemos a cumplir con los servicios conexos para las **Sustitución de cúpulas del palacio de justicia de Puerto Plata**,
- c. Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los términos de referencia del proceso de comparación de precios.
- d. Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el comprador para presentar ofertas.
- e. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del contrato formal.
- f. Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Firma
Sello





FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: jueves 06, junio 2024

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 402-2224078-6
4. RPE del Oferente: 79451
5. Domicilio legal del Oferente: c/ San pedro No. 9, Villa Velásquez, San Pedro de Macorís, Rep. Dom.
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ Dirección: c/ San pedro No. 9, Villa Velásquez, San Pedro de Macorís, Rep. Dom. Números de teléfono y fax: 809-694-7344 Dirección de correo electrónico: osvaldovalera4@gmail.com





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.
Comité de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-04-2024

06 de junio de 2024

Página 1 de 1

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

Señores
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que para el proceso de referencia estamos participando por los siguientes **Lotes:**

Sustitución de cúpulas del palacio de justicia de Puerto Plata.



Firma

Oswaldo Valera

Sello



Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción RPE: 79451

Fecha de registro: 5/2/2019

Razón social: Osvaldo Valentin Valera Jiménez

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Micro Empresa

Ocupación: Ingeniero civil

Domicilio: Calle san pedro, 9, Villa Velasquez

21000 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Osvaldo Valentin Valera Jiménez

Fecha actualización: 26/9/2023

No. Documento: 40222240786 - Cédula

Provee: Servicios, Consultoria, Obras

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:



Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30170000	Puertas y ventanas y vidrio
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
81150000	Servicios de pedología

Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) - 9/4/2024 6:47:38 a.m.



República Dominicana
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 RNC: 4-01-50625-4
 CERTIFICACIÓN



No. de Certificación: **C0224952035160**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ**, RNC No. **4022240786**, con su domicilio y asiento fiscal en **SAN PEDRO DE MACORIS**, Administración Local **ADM LOCAL SAN PEDRO MACORIS**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
• RST 2 CUOTAS	• IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.
• ITBIS	

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: T1X1-YYLP-Q841-7151-8323-1115 sha1: CymkczPerVAkJWoab2b4A2kwQw= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 T1X1-YYLP-Q841-7151-8323-1115

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, **OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ**, en calidad de **INGENIERO CIVIL**, actuando en nombre y representación de **OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMENEZ**, domiciliado en la **CALLE SAN PEDRO NO. 9, VILLA VELÁSQUEZ, SAN EPDRO DE MACORÍS** conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios núm. **CP-CPJ-04-2024**, del Consejo del Poder Judicial para las **Sustitución de cúpulas del palacio de justicia de Puerto Plata**, declaro **BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el Artículo 14 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. Que no hay ningún acuerdo de parte de nosotros (**OSVALDO VALENTÍN VALERA JIMÉNEZ**) con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de **SAN PEDRO DE MACORÍS**, República Dominicana a los **SEIS (06)** días del mes de **JUNIO** del año dos mil veinticuatro (2024).



Ing. Agrim. Osvaldo Valera

C/ San Pedro No. 9, Villa Velásquez, San Pedro de Macorís, RD.

809-694-7344 | osvaldovalera4@gmail.com

RNC: 402-2224078-6 | RM: 571SPM-PF



San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

Jueves 06, junio 2024



**Sustitución de cúpulas del palacio de justicia de
Puerto Plata**

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA



LIC. ELADIO REYES ORTIZ
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
EXEQUATUR 220-88
ICPARD NO.4174
RNC.023-0010903-6

TELEFONO 809-529-5175 Y 809-529-5522/MOVIL 829-265-5175

E-MAIL: eladioreyesortiz@yahoo.com

AVE. GENERAL CABRAL NO.62

SAN PEDRO DE MACORIS, R. D.




Informe del Auditor Independiente

Hemos auditado el Estado de Situación de **OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ**, al 31 de Diciembre de 2022, así como el Estado de Resultados y de Flujo de Efectivo, que le son relativos por el periodo comprendido del 1ro.de Enero de 2022 Al 31 de Diciembre de 2022. Estos Estados Financieros, son responsabilidad de la gerencia de la entidad. Nuestra responsabilidad con respecto a los mismos consiste en expresar una opinión basados en nuestra Auditoria.

Nuestro examen fue efectuado de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), las cuales fueron adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Estas normas requieren que la revisión obtenga un grado de seguridad razonable de que el referido estado se encuentre libre de errores u omisiones significativas que puedan variar sustancialmente su contenido original. Una auditoria incluye examinar en forma selectiva los documentos y evidencias que avalan las revelaciones contenidas en el Estado Financiero, así como los principios y normas contables que hayan sido aplicados, las estimaciones efectuadas, y una evaluación general del Estado en su conjunto.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados de **OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ**, al 31 de Diciembre de 2022, presentan razonablemente su posición financiera, resultados del periodo y flujos de efectivo, de conformidad con normas internacionales de contabilidad (NIAs).



OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ
 ESTADO DE SITUACION
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CIRCULANTE

Efectivo en Caja y Bancos		600,000.00
Cuentas por Cobrar - Clientes	Nota 1	<u>1,195,214.15</u>
Total Activo Circulante		<u>1,795,214.15</u>

FIJO

Propiedad, Mobiliarios y Equipos	Nota 2	<u>1,935,275.00</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>3,730,489.15</u></u>

PASIVO

CIRCULANTE

Préstamos Bancarios		33,000.00
Cuentas por Pagar (Tarjetas de Créditos)		<u>450,000.00</u>
TOTAL PASIVOS		<u>483,000.00</u>

PATRIMONIO

Osvaldo Valentin Valera Jimenez - Patrimonio		<u>3,247,489.15</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>3,730,489.15</u></u>



OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Beneficios Netos	2,316,741.60
Ajustes para conciliar el beneficio neto con el efectivo neto (usado) provisto por las actividades operativas:	
Crédito a Resultados	-155,216.99
Depreciación	304,193.74

CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS.

Aumento en Cuentas por Cobrar - Clientes	-509,214.15
Aumento en Cuentas por Pagar	450,000.00
	-59,214.15
Efectivo neto (usado) provisto por actividades operativas	2,406,504.20



FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de Muebles y Equipos	-1,930,000.00
Efectivo neto (usado) en Actividades de Inversión	-1,930,000.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS

Disminución de Préstamos Bancarios	-42,500.00
Efectivo neto (usado) provisto en actividades financieras	-42,500.00
Disminución neta de efectivo y equivalentes	434,004.20
Efectivo neto y equivalentes al inicio del periodo	165,995.80
Efectivo neto y equivalentes al final del periodo	600,000.00



OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	CUOTAS SOCIALES	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL PERIODO	TOTALES RD\$
Saldos al Inicio	0.00		930,747.55		930,747.55
Resultados		0.00	0.00	2,316,741.60	2,316,741.60
TOTALES	0.00	0.00	930,747.55	2,316,741.60	3,247,489.15



OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOTA 1 CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

UTECT	35,199.35
CONALECHE	696,131.76
DIRECCION GENERAL DE MINERIA	383,928.01
DGCP	79,955.03
	1,195,214.15

NOTA 2 PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS

DESCRIPCION	COSTO DE ADQUISICION	COSTO DE ADICIONES	DEPREC. ACUM.	BALANCE EN LIBROS
EQUIPO DE TRANSPORTE	305,000.00	1,930,000.00	422,324.22	1,812,675.78
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONST.	169,687.50		47,088.28	122,599.22
TOTALES	474,687.50	1,930,000.00	469,412.50	1,935,275.00

EQUIPO DE TRANSPORTE

Motorcicleta Loncin Color Negro - Año 2015
Automovil Hyndai Color Blanco - Año 2008
Jeepeta Ford Explorer Sportrack 2004
Camioneta Dmax 2013
TOTAL



45,000.00
260,000.00
230,000.00
1,700,000.00
2,235,000.00

45,000.00 - 26,015.63 = 18,984.37 X 25% =
260,000.00 - 113,750.00 = 146,250.00 x 25% =
1,930,000.00 x 50% = 965,000.00 x 25% =

4,746.09
36,562.50
241,250.00
282,558.59

139,765.63
282,558.59
422,324.22

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION

Ligadora de Concreto y Otras Herramientas



169,687.50

169,687.50 - 25,453.13 = 144,234.37 x 15% =

21,635.15

25,453.13
21,635.15
47,088.28



LIC. ELADIO REYES ORTIZ
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

EXEQUATUR 220-88

ICPARD NO.4174

RNC.023-0010903-6

TELEFONO 809-529-5175 Y 809-529-5522/MOVIL 829-265-5175

E-MAIL: eladioreyesortiz@yahoo.com

AVE. GENERAL CABRAL NO.62

SAN PEDRO DE MACORIS, R. D.



Informe del Auditor Independiente

Hemos auditado el Estado de Situación de **OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ**, al 31 de Diciembre de 2023, así como el Estado de Resultados y de Flujo de Efectivo, que le son relativos por el periodo comprendido del 1ro. de Enero de 2023 Al 31 de Diciembre de 2023. Estos Estados Financieros, son responsabilidad de nuestro cliente. Nuestra responsabilidad con respecto a los mismos consiste en expresar una opinión basados en nuestra Auditoria.

Nuestro examen fue efectuado de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), las cuales fueron adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Estas normas requieren que la revisión obtenga un grado de seguridad razonable de que el referido estado se encuentre libre de errores u omisiones significativas que puedan variar sustancialmente su contenido original. Una auditoria incluye examinar en forma selectiva los documentos y evidencias que avalan las revelaciones contenidas en el Estado Financiero, así como los principios y normas contables que hayan sido aplicados, las estimaciones efectuadas, y una evaluación general del Estado en su conjunto.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados de **OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ**, al 31 de Diciembre de 2023, presentan razonablemente su posición financiera, resultados del periodo y flujos de efectivo, de conformidad con normas internacionales de contabilidad (NIAs).





OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CIRCULANTE		
Efectivo en Caja y Bancos	Nota 1	2,503,742.17
Cuentas por Cobrar - Clientes	Nota 2	2,865,877.82
Total Activo Circulante		<u>5,369,619.99</u>
FIJO		
Propiedad, Mobiliarios y Equipos	Nota 3	<u>2,594,500.00</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u>7,964,119.99</u>
PASIVO		
CIRCULANTE		
Préstamos Bancarios		
Cuentas por Pagar (Tarjetas de Créditos)	Nota 4	1,136,048.31
TOTAL PASIVOS		<u>1,242,620.64</u>
PATRIMONIO		
Osvaldo Valentin Valera Jimenez - Patrimonio		6,721,499.35
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>7,964,119.99</u>





OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO DEL 1RO. DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS:

Servicios Profesionales (Independiente)
Total Ingresos

6,890,300.00
6,890,300.00

MENOS:

EGRESOS

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Consumo del Hogar (Alimentación y Otros)
Combustibles y Lubricantes
Comunicaciones
Energía Eléctrica
Viajes y Representaciones
Mantenimiento de Equipos
Depreciaciones
Diversos
Gastos Financieros
Beneficios netos del periodo

420,000.00
493,095.20
80,220.00
15,600.00
286,000.00
151,250.00
372,088.28
650,000.00
362,383.20 2,830,636.68
4,059,663.32





OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Beneficios Netos	4,059,663.32
Ajustes para conciliar el beneficio neto con el efectivo neto (usado) provisto por las actividades operativas:	
Crédito a Resultados	-585,653.12
Depreciación	372,088.28
<u>CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS.</u>	
Aumento en Cuentas por Cobrar - Clientes	-1,670,663.67
Disminución en Cuentas por Pagar	-343,427.67
	<u>-2,014,091.34</u>
Efectivo neto (usado) provisto por actividades operativas	1,832,007.14

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de Muebles y Equipos	-1,096,900.78
Retiro de Activos Fijos	65,587.50
Efectivo neto (usado) en Actividades de Inversión	<u>-1,031,313.28</u>



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS

Aumento de Préstamos Bancarios	1,103,048.31
Efectivo neto (usado) provisto en actividades financieras	<u>1,103,048.31</u>
Aumento neto de efectivo y equivalentes	1,903,742.17
Efectivo neto y equivalentes al inicio del periodo	600,000.00
Efectivo neto y equivalentes al final del periodo	<u><u>2,503,742.17</u></u>





OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

	CUOTAS SOCIALES	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL PERIODO	TOTALES RD\$
Saldos al Inicio	0.00		3,247,489.15		3,247,489.15
Resultados		0.00	3,474,010.20		3,474,010.20
TOTALES	0.00	0.00	6,721,499.35	0.00	6,721,499.35





OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOTA 1 EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

BANCO DE RESERVAS	1,250,836.17
BANCO BHD	1,020,751.50
BANCO POPULAR DOMINICANO	232,154.50
	<u>2,503,742.17</u>

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (ASDE)	1,037,785.45
INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS FORESTALES	926,847.43
EDESUR DOMINICANA, S.A.	901,244.94
	<u>2,865,877.82</u>

NOTA 3 PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS

DESCRIPCION	COSTO DE ADQUISICION	COSTO DE ADICIONES	DEPREC. ACUM.	BALANCE EN LIBROS
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,700,000.00	0.00	325,000.00	1,375,000.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONST.	169,687.50	1,096,900.78	47,088.28	1,219,500.00
TOTALES	1,869,687.50	1,096,900.78	372,088.28	2,594,500.00

EQUIPO DE TRANSPORTE

CAMIONETA ISUZU D-MAX LS 2023	1,375,000.00
TOTAL	<u>1,375,000.00</u>

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION

Ligadora de Concreto y Otras Herramientas	1,219,500.00
	<u>1,219,500.00</u>



NOTA 4 PRESTAMOS POR PAGAR

BANCO POPULAR - PRESTAMO NUMERO 833976780 - F/V. 03-06-2028	550,000.00
BANCO SANTA CRUZ - PRESTAMO NO.275877 - F/V. 31-05-2028	350,000.00
PROAMERICA - PRESTAMO NO.3000523516 - F/V. 31-08-2027	236,048.31
TOTAL	<u>1,136,048.31</u>



Ing. Agrim. Osvaldo Valera

C/ San Pedro No. 9, Villa Velásquez, San Pedro de Macorís, RD.

809-694-7344 | osvaldovallera4@gmail.com

RNC: 402-2224078-6 | RM: 571SPM-PF



San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

Jueves 06, junio 2024

Sustitución de cúpulas del palacio de justicia de Puerto Plata

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



LISTADO DE PARTIDAS CON VOLUMETRÍA

Oswaldo Valera



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 CÚPULA EN ÁREA DE LOBBY

1.01	Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	1,043.78	pie ²		-	
1.02	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cupula en cristal clear templado 3/8". (incluye andamios y línea de vida)	1,043.78	pie ²		-	
1.03	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos. (incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	1,043.78	pie ²		-	
1.04	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	26.25	m2		-	
1.05	Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	1.00	pa		-	
1.06	Acarreo y bote de materiales (6 m ³)	5.00	viaje		-	
1.07	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
Sub-total					RD\$	-



2.00 CÚPULA CENTRAL-PRINCIPAL

2.01	Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	2,947.80	pie ²		-	
2.02	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8". (incluye andamios y línea de vida)	2,947.80	pie ²		-	
2.03	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos. (incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	2,947.80	pie ²		-	
2.04	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	140.92	m2		-	
2.05	Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	1.00	pa		-	
2.06	Acarreo y bote de materiales (6 m ³)	10.00	viaje		-	
2.07	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
Sub-total					RD\$	-

LISTADO DE PARTIDAS CON VOLUMETRÍA

Oswaldo Valera



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.00 CÚPULA EN SALA DE AUDIENCIA LABORAL						
3.01	Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	287.10	pie ²		-	
3.02	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8".(incluye andamios y línea de vida)	287.10	pie ²		-	
3.03	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	287.10	pie ²		-	
3.04	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	12.57	m2		-	
3.05	Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	1.00	pa		-	
3.06	Acarreo y bote de materiales (6 m ³)	1.00	viaje		-	
3.07	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
Sub-total					RD\$	-



4.00 CÚPULA EN SALA DE AUDIENCIAS DE LA CORTE

4.01	Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	287.10	pie ²		-	
4.02	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8".(incluye andamios y línea de vida)	287.10	pie ²		-	
4.03	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	287.10	pie ²		-	
4.04	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	12.57	m2		-	
4.05	Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	1.00	pa		-	
4.06	Acarreo y bote de materiales (6 m ³)	1.00	viaje		-	
4.07	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
Sub-total					RD\$	-

LISTADO DE PARTIDAS CON VOLUMETRÍA

Oswaldo Valera



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.00 CÚPULA EN LA BIBLIOTECA						
5.01	Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	287.10	pie ²		-	
5.02	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8". (incluye andamios y línea de vida)	287.10	pie ²		-	
5.03	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos. (incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	287.10	pie ²		-	
5.04	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	12.57	m2		-	
5.05	Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	1.00	pa		-	
5.06	Acarreo y bote de materiales (6 m ³)	1.00	viaje		-	
5.07	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
Sub-total						RD\$ -



6.00 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE Y ACTIVIDADES GENERALES

6.01	Desmonte de lona asfáltica existente	15.00	m2		-	
6.02	Desmonte de estructura metálica existente de todas las cúpulas (incluye desinstalación, acarreo interno, estructura de andamios en techo para el trabajo, bote de desperdicios, resanes de daños durante extracción y partidas relacionadas)	1.00	pa		-	
6.03	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	15.00	m2		-	
6.04	Suministro y confección de fino de techo	15.00	m2		-	
6.05	Suministro e instalación de estructura metálica en perfleria de aluminio 2"x 2" x 1/4" de todas las cúpulas (incluye conexión soldada estructural, pulido, pintura y terminaciones, resanes, preparación de superficie, asientos de grout y actividades relacionadas, andamios en techo)	609.61	m		-	
6.06	Suministro e instalación de estructura metálica en perfleria de aluminio 2" x4" x1/4" de todas las cúpulas (incluye conexión soldada estructural, pulido, pintura y terminaciones, resanes, preparación de superficie, asientos de grout y actividades relacionadas, andamios en techo)	841.45	m		-	
6.07	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
Sub-total						RD\$ -

LISTADO DE PARTIDAS CON VOLUMETRÍA

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA	

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)							-
7.00 GASTOS INDIRECTOS							
7.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		-	
7.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		-	
7.03	Transporte			2.50%		-	
SUB-TOTAL (RD\$)							-
SUB-TOTAL GRAVADO							-
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS							-
				10.00%		-	
7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		-	
7.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		-	
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		-	
7.07	CODIA			0.10%		-	
7.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		-	
7.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		-	
SUB-TOTAL (RD\$)							-
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)							-
7.10	Imprevistos			5.00%		-	
TOTAL GENERAL (RD\$)							-

Oswaldo Valera





Ing. Agrim. Osvaldo Valera

c/ San Pedro No. 9, Villa Velasquez, San Pedro de Macoris

809-694-7344 | osvaldovallera4@gmail.com

RNC: 402-2224078-6 | RM: 571SPM-PF

Jueves 6, junio 2024



Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
CP-CPJ-04-2024			
Sustitución de cúpulas del palacio de justicia de Puerto Plata	107 días	lun 29/7/24	vie 29/11/24
CÚPULA EN ÁREA DE LOBBY	24 días	lun 29/7/24	sáb 24/8/24
Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	3 días	lun 29/7/24	mié 31/7/24
Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cupula en cristal clear templado 3/8.(incluye andamios y línea de vida)	8 días	lun 5/8/24	mar 13/8/24
Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	5 días	mié 14/8/24	lun 19/8/24
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1 día	mar 20/8/24	mar 20/8/24
Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	3 días	jue 1/8/24	sáb 3/8/24
Acarreo y bote de materiales (6 m3)	2 días	mié 21/8/24	jue 22/8/24
Limpieza continua y final.	2 días	vie 23/8/24	sáb 24/8/24
CÚPULA CENTRAL-PRINCIPAL	60 días	mié 14/8/24	mar 22/10/24
Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	6 días	mié 14/8/24	mar 20/8/24
Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8.(incluye andamios y línea de vida)	20 días	sáb 7/9/24	lun 30/9/24
Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	10 días	mar 1/10/24	vie 11/10/24
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1 día	sáb 12/10/24	sáb 12/10/24
Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	6 días	mié 21/8/24	mar 27/8/24
Acarreo y bote de materiales (6 m3)	4 días	lun 14/10/24	jue 17/10/24
Limpieza continua y final.	4 días	vie 18/10/24	mar 22/10/24
CÚPULA EN SALA DE AUDIENCIA LABORAL	11 días	mié 23/10/24	lun 4/11/24
Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	2 días	mié 23/10/24	jue 24/10/24

Objeto: Sustitución de cúpulas del palacio de Puerto Plata.

Referencia: CP-CPJ-04-2024

Programa de ejecución de obra



Ing. Agrim. Osvaldo Valera

Jueves 6, junio 2024

c/ San Pedro No. 9, Villa Velasquez, San Pedro de Macoris

809-694-7344 | osvaldovallera4@gmail.com

RNC: 402-2224078-6 | RM: 571SPM-PF



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	
1	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8.(incluye andamios y línea de vida)	3 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24	19
2	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	1 día	jue 31/10/24	jue 31/10/24	
3	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1 día	vie 1/11/24	vie 1/11/24	
4	Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	2 días	vie 25/10/24	sáb 26/10/24	
5	Acarreo y bote de materiales (6 m3)	1 día	sáb 2/11/24	sáb 2/11/24	
6	Limpieza continua y final.	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	
7	CÚPULA EN SALA DE AUDIENCIAS DE LA CORTE	11 días	mar 5/11/24	sáb 16/11/24	
8	Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	2 días	mar 5/11/24	mié 6/11/24	
9	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8.(incluye andamios y línea de vida)	3 días	sáb 9/11/24	mar 12/11/24	
10	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24	
11	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	
12	Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	2 días	jue 7/11/24	vie 8/11/24	
13	Acarreo y bote de materiales (6 m3)	1 día	vie 15/11/24	vie 15/11/24	
14	Limpieza continua y final.	1 día	sáb 16/11/24	sáb 16/11/24	
15	CÚPULA EN LA BIBLIOTECA	11 días	lun 18/11/24	vie 29/11/24	
16	Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	2 días	lun 18/11/24	mar 19/11/24	
17	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8.(incluye andamios y línea de vida)	3 días	vie 22/11/24	lun 25/11/24	



Objeto: Sustitución de cúpulas del palacio de Puerto Plata.

Referencia: CP-CPJ-04-2024

Programa de ejecución de obra



Ing. Agrim. Osvaldo Valera

Jueves 6, junio 2024

c/ San Pedro No. 9, Villa Velasquez, San Pedro de Macoris

809-694-7344 | osvaldovalera4@gmail.com

RNC: 402-2224078-6 | RM: 571SPM-PF

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	19
3	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	1 día	mar 26/11/24	mar 26/11/24	
4	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1 día	mié 27/11/24	mié 27/11/24	
5	Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	2 días	mié 20/11/24	jue 21/11/24	
6	Acarreo y bote de materiales (6 m3)	1 día	jue 28/11/24	jue 28/11/24	
7	Limpieza continua y final.	1 día	vie 29/11/24	vie 29/11/24	
8	SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE Y ACTIVIDADES GENERALES	40 días	lun 29/7/24	jue 12/9/24	
9	Desmante de lona asfáltica existente	1 día	lun 29/7/24	lun 29/7/24	
10	Desmante de estructura metálica existente de todas las ci	6 días	jue 1/8/24	mié 7/8/24	
11	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada	1 día	mar 10/9/24	mar 10/9/24	
12	Suministro y confección de fino de techo	2 días	sáb 7/9/24	lun 9/9/24	
13	Suministro e instalación de estructura metálica en perfil	15 días	mié 21/8/24	vie 6/9/24	
14	Suministro e instalación de estructura metálica en perfil	15 días	mié 21/8/24	vie 6/9/24	
15	Limpieza continua y final.	2 días	mié 11/9/24	jue 12/9/24	





Ing. Agrim. Osvaldo Valera


Jueves 6, junio 2024

c/ San Pedro No. 9, Villa Velasquez, San Pedro de Macoris

809-694-7344 | osvaldovallera4@gmail.com

RNC: 402-2224078-6 | RM: 571SPM-PF

agosto 2024					septiembre 2024					octubre 2024					noviembre 2024					diciembre 2024					
29	3	8	13	18	23	28	2	7	12	17	22	27	2	7	12	17	22	27	1	6	11	16	21	26	1

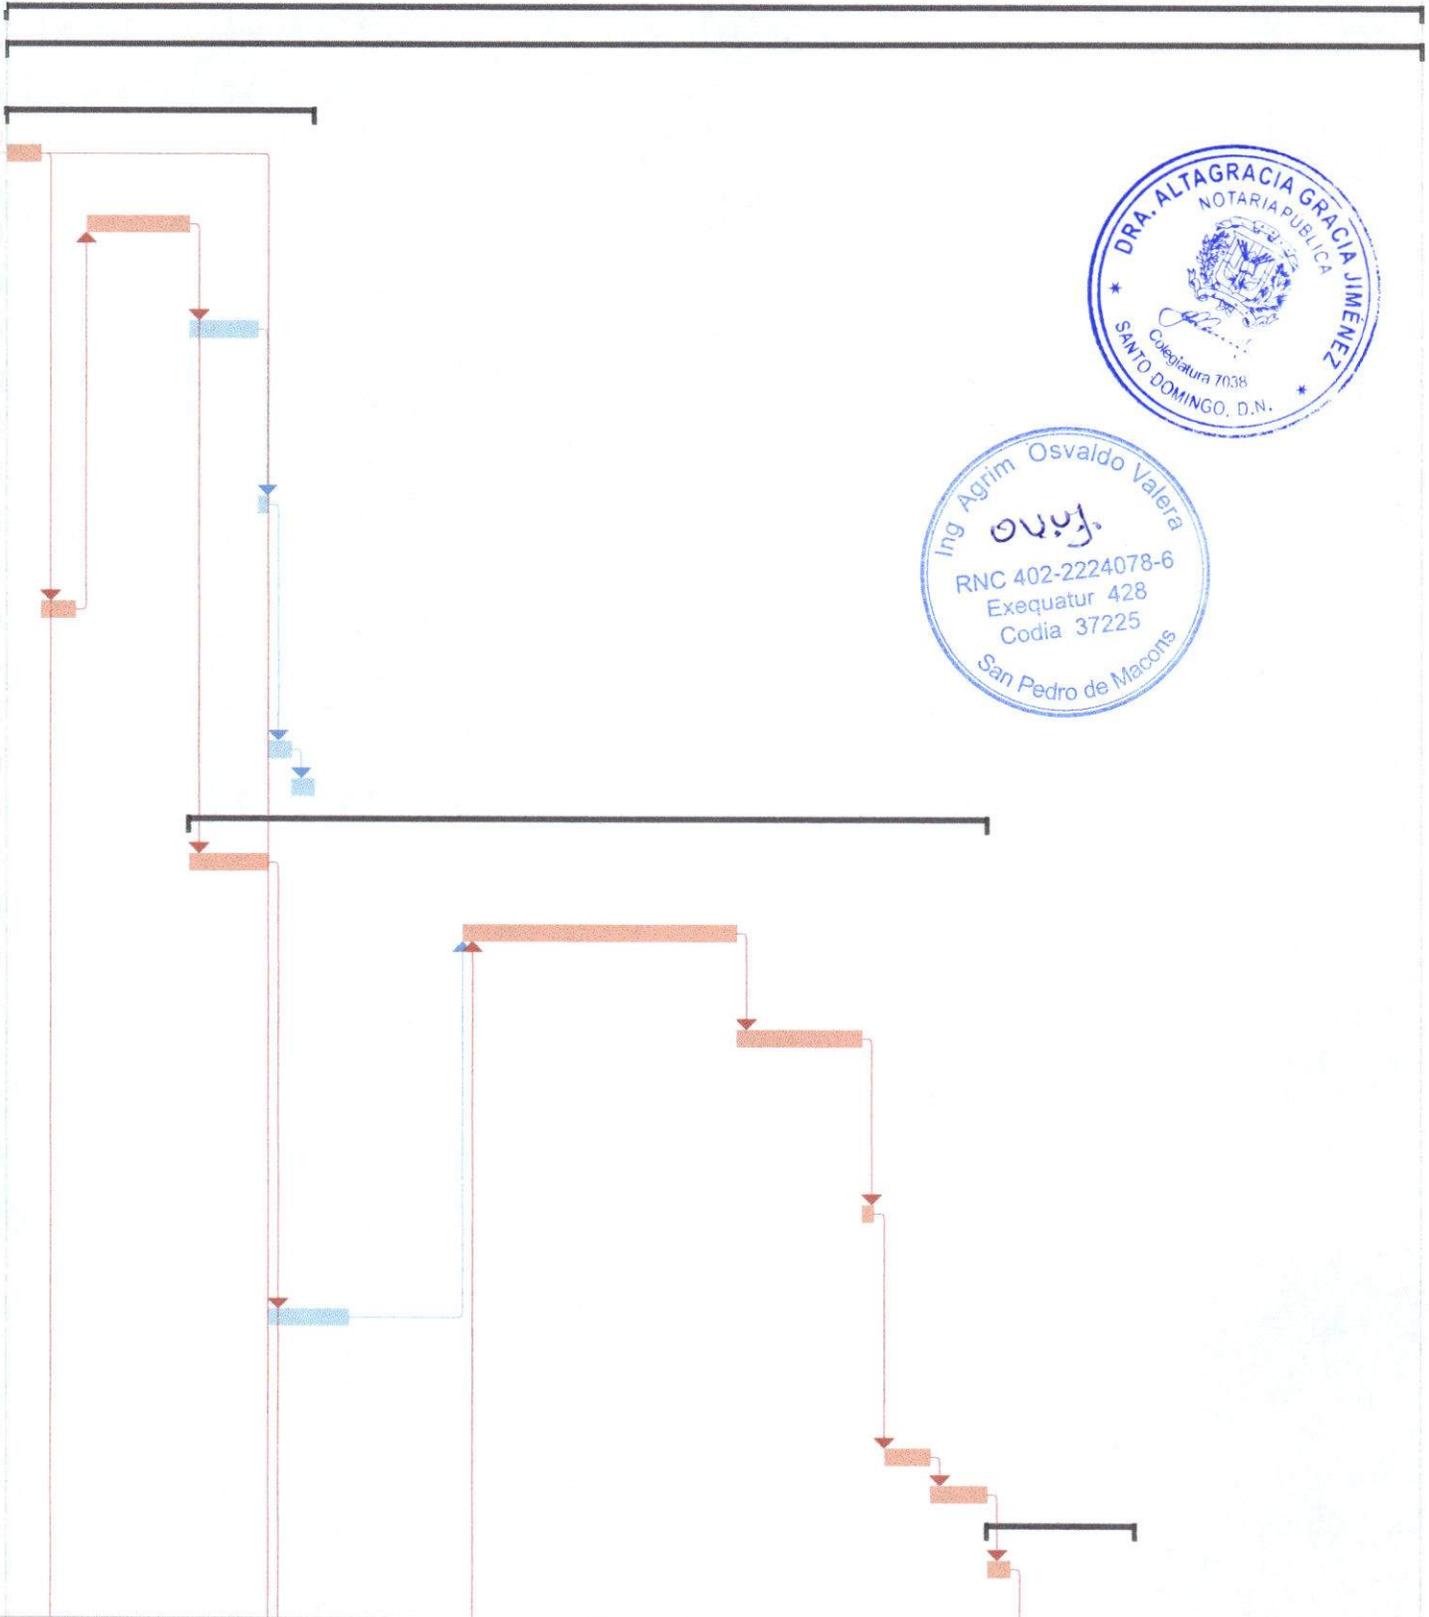

Objeto: Sustitución de cúpulas del palacio de Puerto Plata.

Referencia: CP-CPI-04-2024

Programa de ejecución de obra



Ing. Agrim. Osvaldo Valera


Jueves 6, junio 2024

c/ San Pedro No. 9, Villa Velasquez, San Pedro de Macoris

809-694-7344 | osvaldovalera4@gmail.com

RNC: 402-2224078-6 | RM: 571SPM-PF

agosto 2024					septiembre 2024					octubre 2024					noviembre 2024					dicie						
2	29	3	8	13	18	23	28	2	7	12	17	22	27	2	7	12	17	22	27	1	6	11	16	21	26	1

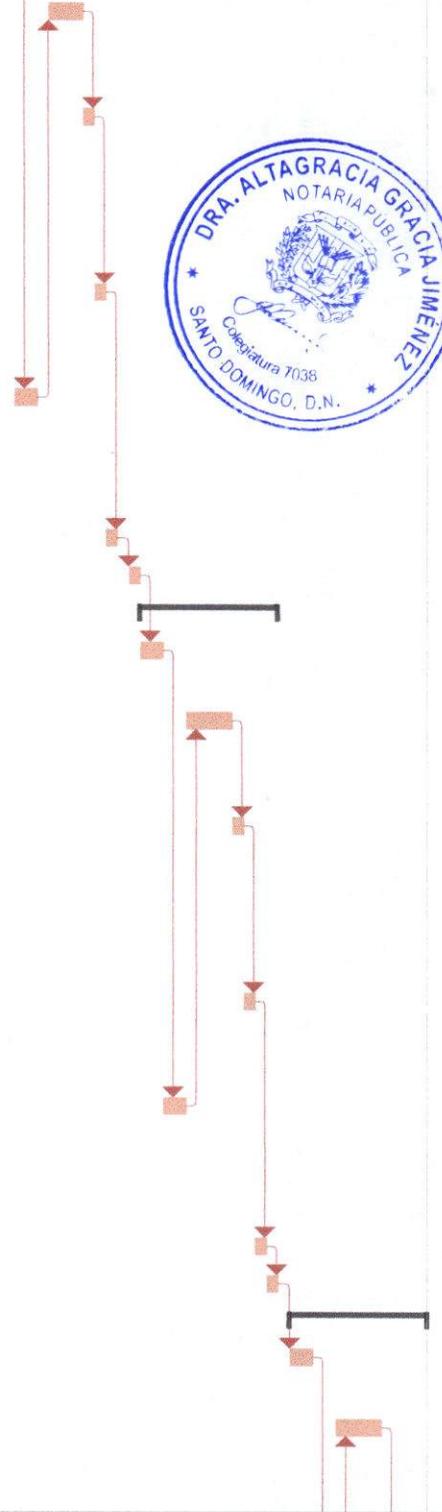

Objeto: Sustitución de cúpulas del palacio de Puerto Plata.

Referencia: CP-CPI-04-2024

Programa de ejecución de obra




Ing. Agrim. Osvaldo Valera

Jueves 6, junio 2024

c/ San Pedro No. 9, Villa Velasquez, San Pedro de Macoris

809-694-7344 | osvaldovallera4@gmail.com

RNC: 402-2224078-6 | RM: 571SPM-PF

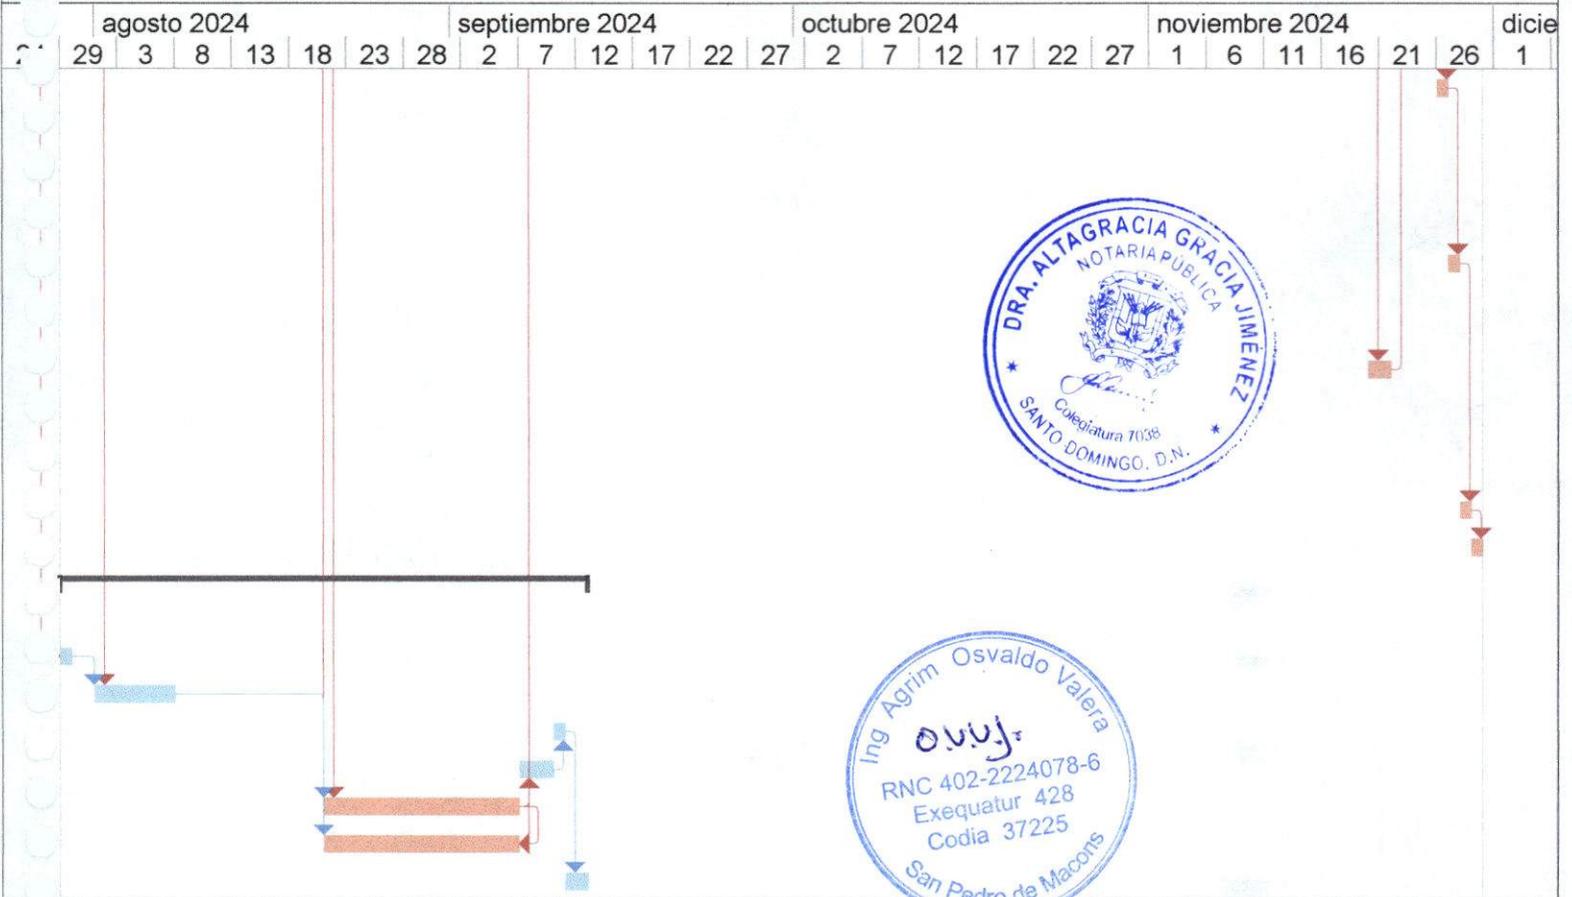



Osvaldo Valera Jiménez

INGENIERO CIVIL/AGRIMENSOR
EXPERIENCIA PROFESIONAL



✉ osvaldovalera4@gmail.com

☎ 809-694-7344

📍 c/ San Pedro No. 9, Villa Velásquez, San Pedro de Macorís

QUIÉN SOY

Graduado en ingeniero civil y agrimensura enfocado en el orden y resultados quien busca insertarse al mercado laboral para poner a disposición los más de 7 años de experiencia adquirida en varios campos del sector construcción tanto en el sector inmobiliario como industrial.

PROGRAMAS

-MS Excel	★ ★ ★ ★ ★
-MS Project	★ ★ ★ ★ ☆
-MS Word	★ ★ ★ ★ ☆
-AutoDesk (Revit, AutoCad, AutoCad Civil 3D)	★ ★ ★ ★ ☆
-CSI (ETABS, SAFE)	★ ★ ★ ☆ ☆
-WinCalculos	★ ★ ★ ★ ☆

REFERENCIAS

- ✓ Diplomado en supervisión y fiscalización de obras, Escuela Nacional de la Construcción (ENACO), Santo Domingo 2017.
- ✓ Diplomado en dirección y ejecución de proyectos, Quality GB, Santo Domingo, 2017.
- ✓ Diplomado en presupuesto y licitación de obras, Quality GB, Santo Domingo, 2017.

De febrero 2020- actualidad (Santo Domingo, RD)

Profesional independiente

Contratista

Tareas realizadas: Realizar el levantamiento de los trabajos requeridos tanto en instituciones publicas como privadas, presupuestar y cotizar los trabajos requeridos, ejecución de trabajos cotizados, contratar personal técnico de obra, supervisar actividades ejecutadas, compra de insumos de obra, cubicación, pago de personal de obra.

De agosto 2019 a Febrero 2020 (Bávaro, La Altagracia, RD)

Best Integral Project Group (Bestinpro)

Sub-Contratista

Tareas realizadas: Dirección técnica, contratación del personal, cubicaciones, programar actividades diarias para la ejecución de los trabajos, cumplir con los estándares de calidad de las exigencias requeridas tanto en ejecución, seguridad laboral y terminaciones donde participamos en la remodelación completa de dos (2) villas de 12 habitaciones cada villa.

De marzo 2019 a agosto 2019 (Bávaro, La Altagracia, RD)

OPS Group S.R.L.

Ingeniero/Agrimensor de Obra

Tareas realizadas: Programar actividades diarias para la ejecución de los trabajos junto con el personal fijo de obra y el subcontratista, supervisar trabajos de los subcontratistas, llevar control tanto de la planimetría como de la altimetría del proyecto, velar que las disposiciones emitidas en los distintos planos se corroboren con la realidad, requisición y compra de materiales, entre otras.

PROYECTOS MACRO

2014: Participación como ingeniero residente en la remodelación de tres (3) naves industriales en el parque industrial de San Pedro de Macorís con la empresa Aquiraz Soluciones S.R.L.

2016: Participación como ingeniero de proyectos en la remodelación del hotel Occidental Punta Cana, antiguo Flamenco, en Bávaro, La Altagracia con la empresa Tamberwick S.R.L.

2017: Participación como ingeniero de obra en la construcción y readecuaciones de varias naves industriales en para uso de almacenes ubicado el sector San Miguel en la Prolongación Independencia, Santo Domingo Oeste.

2017-2018: Funciones como gestor de proyectos en varias obras en estructuras metálicas para la empresa A&H Industrial S.R.L. ubicada en la vega en proyectos a nivel nacional.

EDUCACIÓN

Año 2016
San Pedro de Macorís, RD

Ingeniero Civil
Universidad Central del Este (UCE)

Año 2019
San Pedro de Macorís, RD

Agrimensor
Universidad Central del Este (UCE)



Universidad Central del Este

Fundada el 15 de Octubre de 1970

SAN PEDRO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA

El Consejo Universitario en virtud de las disposiciones legales vigentes:



Por cuanto: *Osvaldo Valentín Valera Jiménez*

ha cursado en la

Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales

de esta Universidad los estudios requeridos y ha sido aprobado en los exámenes correspondientes.

Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el título de

Ingeniero Civil

Y para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma, firmado y sellado en San Pedro de Macorís, República Dominicana, hoy día 24 de Junio del año 2016

Lic. Piedad Licelott Noboa Mejía
El Secretario de la Universidad



Lic. José Nazim Torres
EL RECTOR

Universidad Central del Este

Fundada el 15 de Octubre de 1970
SAN PEDRO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA



El Consejo Universitario en virtud de las disposiciones legales vigentes:

Por cuanto: **Oswaldo Valentín Valera Jiménez**

ha cursado en la

Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales

de la Universidad los estudios requeridos y ha sido aprobado en los exámenes correspondientes.

Por tanto, ha venido en otorgarle y le atorga el título de

Agrimensor

Y para que sea notorio y constante lo expide el presente Diploma, firmado y sellado en San Pedro de Macorís, República Dominicana, hoy día 22 de Febrero del año 2019

Lic. Piedad Licdott Noboa Mejía
EL SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD



Lic. José Hazim Torres
EL RECTOR

REGISTRADO BAJO EL N.º NT - 702 FOLIO 20
DEL LIBRO DE GRADOS Y TITULOS





REPÚBLICA DOMINICANA



CERTIFICA



OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ

Ha completado exitosamente el diplomado:

DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Desde el domingo 21 de mayo al domingo 6 de agosto, 2017

Franklin Morrison
FRANKLIN MORRISON
CEO





**Escuela Nacional de la Construcción
(ENACO)**

Otorga el presente

Certificado

A: Osvaldo N. Valera J.

por haber completado los requisitos dispuestos por esta institución correspondiente al

DIPLOMADO EN SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Expedido en Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana,
a los 24 días del mes Junio del año 2017


Ing. José Báez
Director General

Registrado bajo el número 0000072
Folio EDC-02 del libro de Fidei


Arq. Johannys Tatis
Sub-Directora Docente



REF: D. 314-01/17-17-17



CERTIFICA



OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ

Ha completado exitosamente el diplomado:

PRESUPUESTO Y LICITACIÓN DE OBRAS

Desde el sábado 2 de septiembre al sábado 11 de noviembre, 2017

Franklin Morrison
FRANKLIN MORRISON
CEO

