



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
REPUBLICA DOMINICANA



### CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2020

PROYECTO: CENTRO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL EDIFICIO DE LAS CORTES

TIEMPO ESTIMADO: ( 8 SEMANAS)

| NO.         | DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS   | MES 1    |          |          |          | MES 2    |          |          |          |
|-------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |   | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 |
| <b>1.00</b> | <b>PRELIMINARES</b>   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.01        | Desmante de puertas completas sencillas   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.02        | Desmante de puertas completas doble   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.03        | Desmante de Lámparas existentes   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.04        | Desmante de estrado y plataforma existentes   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.05        | Desmante de aparatos sanitarios existente   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.06        | Mantenimientos en puertas sencillas existentes  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.07        | Demolición de muros de sheetrock  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.08        | Demolición de muros de bloques  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.09        | Retiro de cerámica de pared   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.10        | Demolición de pisos existentes en área de baño  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.11        | Retiro de zócalos existentes  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.12        | Traslado de material a lugar de acopio  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.13        | Bote de material acopiado   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>2.00</b> | <b>MUROS</b>  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.01        | Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.02        | Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, (Incluye estructura calibre 22)                            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>3.00</b> | <b>TERMINACIÓN DE TECHO</b>   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.01        | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)                |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.02        | Suministro e Instalación de fascia en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles |          |          |          |          |          |          |          |          |



*J. N.P.*



| 4.00 VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.01                             | Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.02                             | Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.03                             | Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.04                             | Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.05                             | Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01                             | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.02                             | Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.03                             | Suministro e Instalación de Salidas cenitales   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.04                             | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.05                             | Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.06                             | Suministro e Instalación Salida de Data   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.07                             | Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 1", registros de 6" x 6" x 6, abrazaderas emt 1", conectores rectos de 1" coplin de 1")                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.08                             | Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.09                             | Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10                             | Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11                             | Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.00 TERMINACIONES DE PISOS      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01                             | Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver especificaciones)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.02                             | Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.02                             | Resane en pisos en general  |  |  |  |  |  |  |  |  |



*Jay H. P.*

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>8.00</b> | <b>PINTURA</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01        | Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.02        | Suministro y aplicación de Pintura Satinada  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>9.00</b> | <b>MISCELÁNEOS</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01        | Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.02        | Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.03        | Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.04        | Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.05        | Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.06        | Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.07        | Limpieza Continua y Final  |  |  |  |  |  |  |  |  |



*[Handwritten signature]*



COLEGIO DOMINICANO  
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS  
Y AGRIMENSORES (CEDIA)



APELLIDOS:

NOMBRES:

Dipre Agnasvivas      Jean Carlos

PROFESION:

Ingeniero Civil

EXEQUATUR 249

D/F: 06/07/2018

CEDULA: 402-2096480-9

COLEGIATURA: 38240

*[Handwritten signature]*

Firma colegiado

*[Handwritten signature]*

Firma Presidente





**CODIA**

**Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores**

CALLE PADRE BILLINI No. 58  
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.don  
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0034



**"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"**

**"CERTIFICACIÓN"**

**"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)  
**JEAN CARLOS DIPRE AGUASVIVAS \*\*\*\*\*** portador(a) de la  
Cédula de Identidad Electoral No. 40220964809 , es miembro del Colegio  
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con  
la Colegiatura No. 38240, Exequatur No. 249 , de fecha 26/09/2016  
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 19 días  
del mes de Agosto del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359  
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195  
Presidente CODIA





Santo Domingo  
13 de agosto de 2020  
Ciudad. –

Señores:  
A quien pueda interesar

Por medio de la presente hago de su conocimiento que la empresa **DISK MULTISERVICIOS S.R.L** con el RNC 1-31-51799-4, nos brinda su servicio desde el año 2019 en todo proyecto de remodelación, aire acondicionados y reparaciones eléctricas; Brindando sus servicios con alta responsabilidad y confiabilidad.

Por lo que recomendamos sus servicios.

Se despide,



Luis Rivas  
Director Operaciones



**A quién pueda interesar**

Distinguidos señores,

Por medio a la presente, tenemos a bien informarles que la empresa **Disk Multiservices S.R.L.** con el **RNC No. 1-31-51799-4**, estuvo trabajando en la remodelación total de nuestra oficina en la climatización, electricidad, plomería en general, y preparación o construcción de los espacios de la oficina en sheetrock cumpliendo con cada una de nuestras exigencias en cuanto a calidad y tiempo.

Demostrando una alta capacitación operacional y facilidades administrativas en cada uno de ellos.

A solicitud de la parte y para los fines de lugar,

Att.:



**Robert Guzmán Cepeda**  
Gte. General





19 de agosto, 2020  
Santo Domingo, D.N.  
República Dominicana

***A quién pueda interesar***

Distinguidos señores,

Por medio a la presente, les informamos que la empresa **Disk Multiservices** mediante su representante Lorenzo Armando Fuerte, hace aproximadamente 6 años estuvieron a cargo de los trabajos de remodelación de nuestra oficina en la climatización, electricidad, plomería, y preparación o construcción de los espacios en sheetrock.

Demostrando capacidad operacional y facilidades al servicio requerido por nosotros.

A solicitud de la parte y para los fines de lugar,

Att.:

  
**Domingo Tejeda**  
Gte. General





0000687



11 JUN 2019

"Año de la Innovación y la Competitividad"




A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **Disk Multiservices, RNC 131517994**, registrada en la Calle Winston Arnaud No.10, Los milloncitos, mantiene relaciones comerciales con nuestra empresa como proveedor de servicios múltiples, cumpliendo satisfactoriamente con sus compromisos y servicios prestados a nuestra empresa, desde el inicio de sus actividades, por lo cual podemos recomendar y dar referencia positiva de sus labores.

Esta constancia se expide a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a los once (11) días del mes de junio del año 2019.

Vilma A. Perez Diaz  
Vicepresidente de Administración y Finanzas

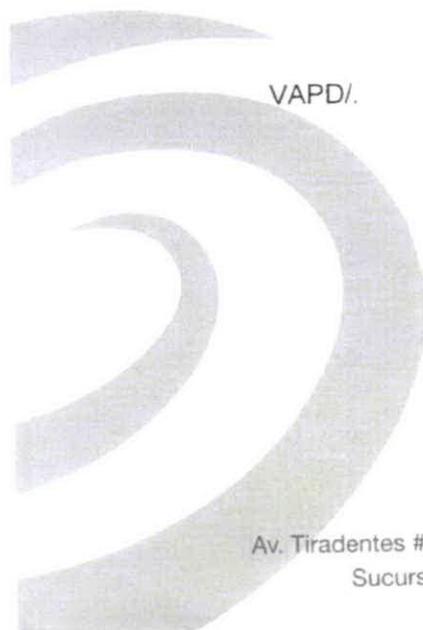

VAPD/.



Miembros de  
**berneunion**

Av. Tiradentes # 53 Aptdo. 1504 Tel.: 809-565-6621 RNC 101-02283-3 Santo Domingo, D.N.  
Sucursal Santiago, Aptdo. 795 Tel.: 809-582-7121 | [www.bandex.com.do](http://www.bandex.com.do)

Santo Domingo, D. N.  
27 de agosto del 2019

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Distinguidos Señores,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa Disk Multiservices Con el RNC / Cedula 131-51799-4. Ofrece a nuestra empresa Dom Alive S.R.L., servicios de refrigeración desde junio 2018.

Sin más por el momento, se despide,

Atentamente

  
Cristal Adames  
Departamento Legal







10 de Junio 2019

### Carta de Referencia Comercial

Por medio de la presente hago constar que la empresa Disk Multiservices, con RNC 131517994 y registrada en en la dirección Calle Winston Arnaud número 10, Los Milloncitos, mantiene relaciones comerciales con nuestra empresa como proveedor, cumpliendo satisfactoriamente, con sus compromisos y servicios prestados a nuestra empresa, desde el inicio de sus actividades.

En varias oportunidades le hemos solicitado asistencia en posibles emergencias y han cumplido en los términos acordados a nuestra entera satisfacción.

Razón por la cual damos fe, que es una persona cumplidora de los compromisos laborales y morales adquiridos motivo por el cual la recomendamos ampliamente.

Constancia que se expide a solicitud de la parte interesada, para los fines de referencia.



Ing. Isaías Herrera T.  
Infraestructura y Seguridad









Estimados,

Gerencia de Compras y Contrataciones

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes.

Mediante esta comunicación damos a conocer que la empresa Disk Multiservices SRL, RNC 131517994 y su personal cuenta con más de los 5 años de experiencia, lo requeridos como mínimo para esta licitación. Como muestra de nuestro tiempo de experiencia procedimos a solicitar una de las cartas de recepción de trabajo satisfactoria a uno de nuestros clientes más antiguos. En la misma el cliente especifica la fecha en que se realizó la remodelación de sus oficinas.

Saludos,

Lorenzo Fuerte

Disk Multiservices



# JEAN CARLOS DIPRE AGUASVIVAS

**Dirección:** C/Los Arbolitos, 13, Las Arecas, San Cristóbal

**Cedula:** 402-2096480-9

**Codia:** 38240

**Estado Civil:** Soltero

**Teléfonos:** (829) 835-0060 / (809) 279-3693

**E-mail:** [diprejc@gmail.com](mailto:diprejc@gmail.com)



## EDUCACIÓN

---

- ✓ **Ingeniería Civil**, (INTEC), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (2013–2016).
- ✓ **Diplomado Dirección y Ejecución de Proyectos**, (Quality GB) (2017)
- ✓ **Curso de Inglés por Inmersión** (MESCYT) (2017-2018)
- ✓ **AutoCAD Básico**, (Loyola), Educación Continuada (2013)

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

---

Gerente de Ingeniería y CO-Owner en **Disk Multiservices SRL** (2017-Actualidad), al frente de proyectos como:

- Remodelaciones en el Lobby, Oficina contabilidad y Archivos del Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex).(Mayo 2019).
- Construcción del Laboratorio para Hidrocarburos DT Inspection and Consulting.(Febrero 2019-Actualidad).
- Impermeabilización de Techo en el Hotel Hodelpa Nicolas de Ovando en la zona Colonial. (Octubre 2018)
- Remodelación de Aulas e Impermeabilización de Techos en la Escuela Básica de Jeringa. (Agosto 2018)
- Remodelaciones varias en cocinas de los restaurantes de la cadena Kentucky Food Group (KFC). (Agosto 2018-Actualidad).
- Construcción de Estructura en acero inoxidable para la fachada del Edificio Administrativo y de Ventas en Valiente Fernández de Av. Luperón. Febrero 2018.
- Remodelación Oficinas y Almacén de la compañía de medicamentos Evafenac. Marzo 2018.
- Remodelación instalaciones eléctricas de las áreas de Emergencia, Internamiento, Cocina y Lavandería. Además de Confección e Instalación de Mobiliarios Industriales en acero inoxidable, en las áreas de Cocina y Lavandería del Hospital Toribio Bencosme. Espailat Moca. Enero 2018.
- Remodelación instalaciones eléctricas de Edificio Quirúrgico, Cocina y Lavandería. Además de Instalación Cocina Industrial, Topes y Mobiliario en acero inoxidable, de las áreas de Emergencias, Consulta y Laboratorio del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello. 2017-2018.

- Remodelación instalaciones eléctricas Primer Nivel Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina. Julio 2017.



De manera individual como ingeniero civil, al frente de proyectos como:

- Remodelación de Local Comercial D' Itaros Tours. (Abril -Junio 2019)
- Construcción del Edificio Alexandra I de tres niveles y 5 apartamentos en San Cristóbal. (Septiembre 2018-Mayo 2019).
- Remodelación de la Discoteca Cuper, en el complejo turístico Paraíso Doña Santa Cuper. (Diciembre 2018-Enero 2019).
- Remodelación Comando de Campaña del PLD en San Cristóbal. (Enero 2019).
- Remodelación Comando de Campaña del PRD en San Cristóbal. (Marzo 2019).
- Ingeniero residente en la obra construcción de Imbornales y Muros de Mampostería en el tramo desde entrada Ana Ramírez hasta Cruce de Canastica de la carretera Sánchez, San Cristóbal. (Contratista Arq. Héctor Garcés). 2017.
- Ingeniero Residente en la obra: Construcción de Badenes, Drenaje Pluvial y Asfaltado de calle La Metalúrgica, sector Madre Vieja Norte San Cristóbal. Contratista (Engineerinc Helite & Helgan SRL). 2017
- Ingeniero residente en la obra construcción de aceras, contenes y badenes del Km 2 $\frac{1}{2}$  de la carretera Sánchez, San Cristóbal. (Contratista Arq. Héctor Garcés). 2016-2017.
- Pasante en la obra de Reconstrucción de aceras, contenes, badenes y capa de rodadura de la carretera Nigua San Cristóbal. (Contratista Ing. Alejandro Brioso). 2014
- Supervisión construcción Edificio Laura de 5 apartamentos y dos locales comerciales en San Cristóbal. Contratista (Constructora Garcés Castillo, SRL).

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Participaciones:** II Congreso Internacional de Ingeniería Estructural (2015)

**Idiomas:** Dominio del inglés y español (nativo).

**Dominio de Software:** Revit, AutoCAD, Microsoft Office (Project, Excel, Word, etc).

## REFERENCIAS PROFESIONALES Y/O LABORALES

**Personales:** Ing. Junior Ferreras (829) 517-3633  
 Ing. José Cepeda Acosta (809) 302-4433

**Laborales:** Arq. Héctor Garcés de la Rosa (809) 250-4747  
 Ing. Marcell Tejeda Sánchez (849) 919-1551



*Fg HCL*



## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas otorga a:

**Jean Carlos Dipre Aguasbivas**

EL DIPLOMA DE:

**Ingeniero Civil**



En reconocimiento de los méritos alcanzados durante el período de estudios cursado en esta Institución y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de la misma.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

hoy día 26 de septiembre del 2016

  
DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) DE REGISTRO

REGISTRADO BAJO EL No. 28,653  
LIBRO No. 9 FOLIO No. 70

  
RECTOR (A)



